

Uitgevoerd onderhoud Molens 2024

Eigenaar: Stichting De Groninger Poldermolens



Uitgevoerd onderhoud Molens 2024

Uitwerkingsdatum: 24 maart 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Wieringa bouwadvies

0595 44 31 92 – 06 55 80 85 93 – info@wieringabouwadvies.nl – wieringabouwadvies.nl
Hoofdstraat W4a, 9951 AB Winsum – KVK 02087227 – BTW 814180449B01 – NL30 RABO 0363 7279 81

© 2025. Wieringa bouwadvies, Winsum. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige schrijfwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Wieringa bouwadvies.



Inhoud

.....	2
Inleiding	4
Algemeen	4
1. Koningslaagte te Zuidwolde	5
2. Krimstermolen te Zuidwolde	6
3. Langelandstermolen te Garmerwolde	7
4. Noordermolen te Noorddijk	8
5. De Palen te Westerwijtwerd	9
6. 't Witte Lam te Zuidwolde	10
7. Zilvermeeuw te Onderdendam	11
8. Kloostermolen te Garrelsweer	12
9. Meervogel te Hoeksmeer	13
10. Olinger Koloniemolen te Laskwerd	14
11. De Eendracht te Sebaldeburen	15
12. De Eolus te Den Ham	16
13. Hilmahuister te Visvliet	17
14. De Jonge Held te Leegkerk	18
15. Westerhorner te Grijpskerk	19
16. Zuidwendinger te Vierverlaten	20
17. Zwakkenburger te Niezijl	21
18. Wilhelmina te Noorderhoogebrug	22

Inleiding

In het kader van de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) 2019-2024 zijn in 2024 bij de molens van Stichting De Groninger Poldermolens onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In dit rapport is te lezen welke werkzaamheden bij deze molens zijn uitgevoerd. Door middel van een kort fotoverslag wordt vervolgens een beeld gegeven van de onderhoudswerkzaamheden van de desbetreffende molens.

Algemeen

Algemene opmerkingen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de molens in het jaar 2024:

- Door Saval (Breda) zijn alle kleine blusmiddelen in de molens gecontroleerd, onderhouden en waar nodig vervangen.
- Door Hankel's Technisch Bedrijf (Wommels) zijn de bliksembeveiligingsinstallaties van de molens gecontroleerd en waar nodig zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
- De werkzaamheden aan de molens van Stichting De Groninger Poldermolens zijn begeleid door Wieringa bouwadvies.
- Een project voor de molens is in uitvoer waarbij nieuwe informatieborden bij de molens geplaatst worden.

1. Koningslaagte te Zuidwolde

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Sommer Schilderwerken (Emmen) is het schilderwerk van het voor- en achterkeuvelens tezamen met de kisten en kistramen uitgevoerd.
- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is plaatselijk klein herstel aan de rietbedekking uitgevoerd.



2. Krimstermolen te Zuidwolde

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Siegersma gevelrenovatie (Berltsum) is het metselwerk van de keermuur aan de boezemzijde hersteld.
- Door Bouwbedrijf Werkman (Stedum) is de ondersteuning voor de rollaag geplaatst en is het hekwerk hersteld.

De twee houten vijzels staan momenteel stil in afwachting van onderhoud.



3. Langelandstermolen te Garmerwolde

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp) zijn vier nieuwe druiven geleverd en gemonteerd.
- Door Cor Pettinga glas & schilderwerken (Winsum) is het schilderwerk aan de luiken en kistramen uitgevoerd. De spruitluiken zijn geschilderd naar historische verantwoording. Afbeelding rechtsonder dateert uit 1943, dit is de leidraad om de spruitluiken in de authentieke witte kleur te maken.



4. Noordermolen te Noorddijk

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is plaatselijk klein herstel aan de rietbedekking van de kap en romp uitgevoerd.
- Door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp) is de bezaanstok vernieuwd. De stormluiken, zwaarden en hammen zijn vernieuwd en de waterkering bij het steenbord en rondom de askop is verbeterd. De vangstok en bezaan zijn voorzien van nieuwe kettingen. Diverse pennen en haken in de betonnen kruiring zijn hersteld.

Voor de Noordermolen is een restauratie in het kader van de GRRG (Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten Groningen) in uitvoering aan het gevlucht en de houten vijzel door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp).



5. De Palen te Westerwijtwerd

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:



- Door Gjaltema impregneerbedrijf (Grijpskerk) is betonreparatie uitgevoerd aan de waterloop.
- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de penbalk en diverse kleppen van de zelfzwichting zijn vervangen. Tevens is de wachtdeur kozijn hersteld.
- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de stalen waterpeluw vervangen.



6. 't Witte Lam te Zuidwolde

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is herstelwerk aan de lange schoor uitgevoerd en zijn delen van het boventafelement hersteld.
- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is het riet geleverd voor de werkzaamheden aan de kap.

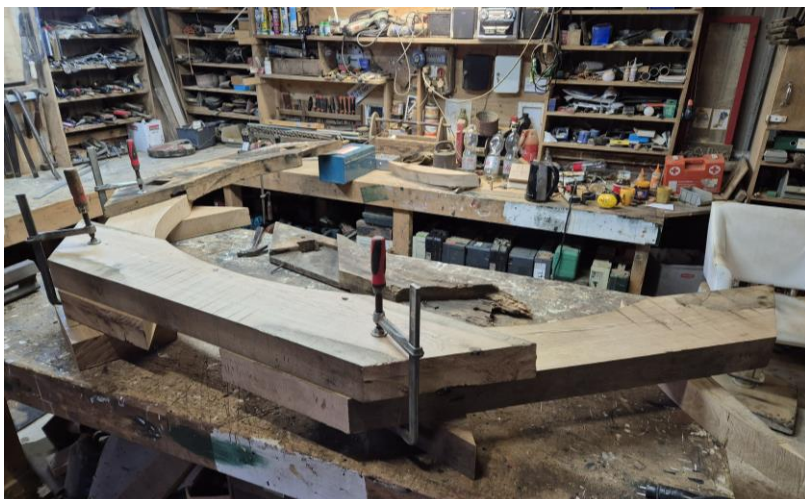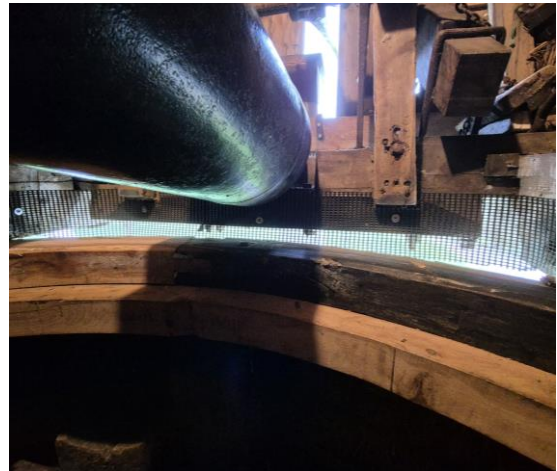

7. Zilvermeeuw te Onderdendam

In het jaar 2024 is naast het onderhoud van Saval en Hankel's geen verder onderhoud aan de molen uitgevoerd.

Het uit te voeren onderhoud, in het kader van de SIM 2019-2024, wordt in 2025 uitgevoerd. Hier is door de RCE uitstel voor verleend. Door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp) zal een nieuwe roede geleverd worden.



8. Kloostermolen te Garrelsweer

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is plaatselijk klein herstel aan de rietbedekking uitgevoerd.
- Door Cor Pettinga glas & schilderwerken (Winsum) is het schilderwerk bijgewerkt.
- Door Siegersma gevelrenovatie (Berlikum) is de kade boezemzijde hersteld.
- Door De Molenmakers (Tzummarum) zijn de treklatten vervangen, de busselneuzen gedemonteerd en gemonteerd voor controle en de trekstangen in de kapconstructie aangebracht.



9. Meervogel te Hoeksmeer

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Gjaltema impregneerbedrijf (Grijpskerk) is betonreparatie uitgevoerd.
- Door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp) zijn de voorkeuvelens, luiken, stormschild en molplanken vernieuwd.

Voor de Meervogel is een restauratie in het kader van de GRRG (Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten Groningen) in uitvoering aan het gevluht en de houten vijzel door A.D.H. Molenbouw & Constructies (Adorp).



10. Olinger Koloniemolen te Laskwerd

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is plaatselijk klein herstel aan de rietbedekking uitgevoerd.
- Door Hoekstra Bedrijfshygiëne (Tijnje) is houtwormbestrijding uitgevoerd door middel van oppervlaktebehandeling in de binnenzijde van de molen.
- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is onderhoud aan het gevlucht uitgevoerd en zijn de spruitluiken vervangen.



11. De Eendracht te Sebaldeburen

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is herstel aan de taatspot uitgevoerd.


Het uit te voeren onderhoud, in het kader van de SIM 2019-2024, wordt in 2025 uitgevoerd. Hier is door de RCE uitstel voor verleend. Een nieuwe roede zal in 2025 geleverd worden.



12. De Eolus te Den Ham

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is herstelwerk aan de ophanging vangstok en overring uitgevoerd.

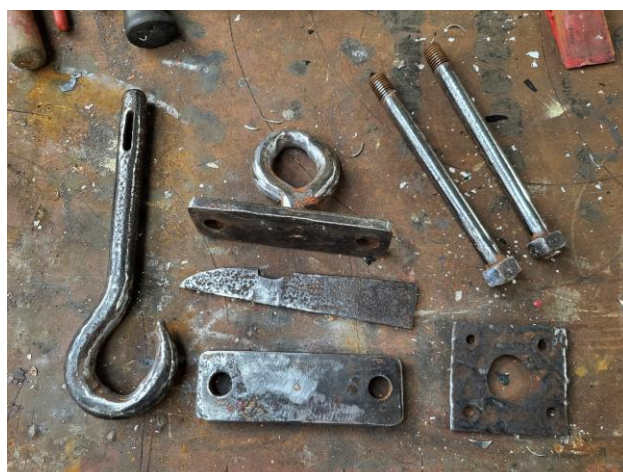


13. Hilmahuister te Visvliet

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Dijkstra Molenbouw & Restauratie (Sloten) worden werkzaamheden uitgevoerd, de spruit vervangen en is het kruiwerk hersteld.

Het uit te voeren onderhoud, in het kader van de SIM 2019-2024, wordt in 2025 uitgevoerd. Hier is door de RCE uitstel voor verleend.

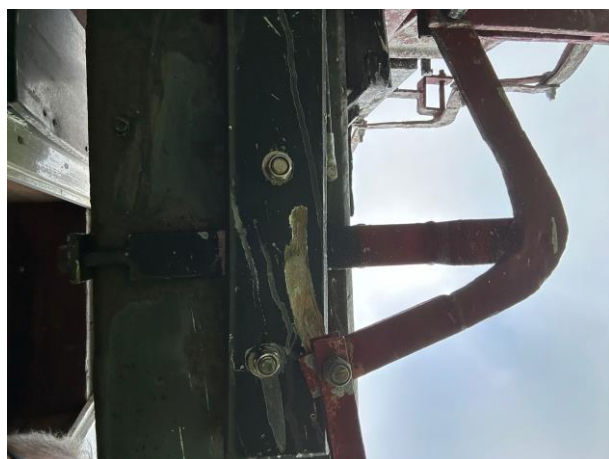

14. De Jonge Held te Leegkerk

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:


- Door Cor Pettinga glas & schilderwerken (Winsum) schilderwerk en het houtrot hersteld.
- Door Dijkstra Molenbouw & Restauratie (Sloten) is het toegangshek hersteld.
- Door Mulder Loonbedrijf (Noorddijk) is herstel aan de kroosbrug uitgevoerd.
- Door Rietdekkersbedrijf Kleinjan (Den Ham) is plaatselijk klein herstel aan de rietbedekking uitgevoerd.



15. Westerhorner te Grijpskerk

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn de korte spruit en twee korte schoren vervangen.

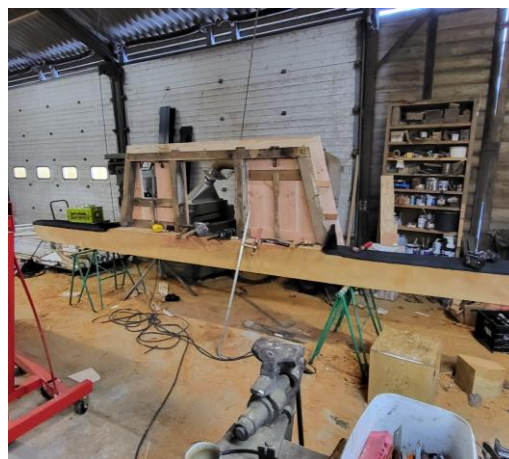

16. Zuidwendinger te Vierverlaten

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de onderbonkelaar gerestaureerd en hersteld inclusief twee nieuwe plooielstukken.
- Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de lasnaadcontrole voorbereid en zijn twee treklatten vervangen.


Door SGS Nederland B.V. (Beilen) zijn de lasnaden gecontroleerd en deze zijn allemaal goedgekeurd. SGS is een internationaal test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Van de gecontroleerde lassen is een verslag opgesteld. De roeden zijn gefabriceerd en gestoken in 1990 en hebben een leeftijd van 35 jaar.



17. Zwakkenburger te Niezijl

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Dijkstra Molenbouw & Restauratie (Sloten) is de vijzel gedemonteerd en hersteld. Tevens zijn kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de krooshekken, kap en het gevlucht.

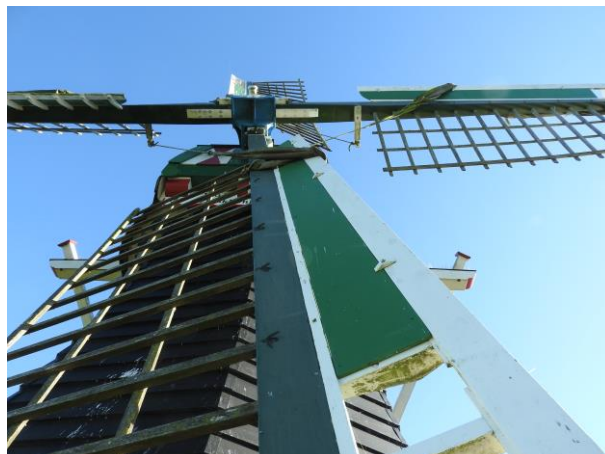

18. Wilhelmina te Noorderhoogebrug

In het jaar 2024 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:

- Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn de roeden doorgehaald. Tevens zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de stelling waarbij enkele stellingliggers en hekmandjes zijn vervangen tezamen met een lange schoor.

Door SGS Nederland B.V. (Beilen) zijn de lasnaden gecontroleerd en deze zijn allemaal goedgekeurd. SGS is een internationaal test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Van de gecontroleerde lassen is een verslag opgesteld. De roeden zijn gefabriceerd en gestoken in 1996 en hebben een leeftijd van 29 jaar.

